

Prüfprotokoll für den Messaufbau bei Kaskadenschaltung




Unterlagen bitte an:
eeg-kwk@stadtwerke-straubing.de

Anlagenanschrift:

Anlagenbetreiber:

MK B4: Kaskadenschaltung

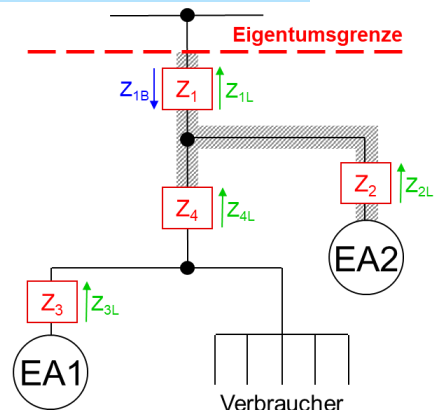

Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung
 Z₂, Z₃, Z₄: Zähler für Lieferung

1.) Zählerbeschriftung:

Z₁ = Zählnummer:

Z₂ = Zählnummer:

Z₃ = Zählnummer:

Z₄ = Zählnummer:

Weitere Zähler:

Ja

Zählerbeschriftung wurde durchgeführt und auf Zuordnung nach dem Messkonzept B4 Kaskadenschaltung geprüft.
Im schraffierten Bereich sind keine Verbraucher angeschlossen!

2.) Anlagenzuordnung wurde geprüft:

Stand 04/2021

EA1 = Energieträger

Leistung

EA2 = Energieträger

Leistung

3.) Prüfung der Messwerte:

Ja

a.) EA1 in Betrieb - EA2 außer Betrieb

Energiemenge der Erzeugung an Z₂L bleibt unverändert

Einspeiseenergiemenge an Z₄L ist gleich groß wie an Z₁L

Energiemenge der Erzeugung an Z₃L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z₄L

b.) EA1 außer Betrieb - EA2 in Betrieb

Energiemenge der Erzeugung an Z₃L bleibt unverändert

Energiemenge der Einspeisung an Z₄L bleibt unverändert

Energiemenge der Erzeugung an Z₂L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z₁L

c.) EA1 und EA2 in Betrieb

Energiemenge der Erzeugung an Z₃L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z₄L

Energiemenge der Erzeugung an Z₂L ≥ Energiemenge der Einspeisung an (Z₁L-Z₄L)

Energiemenge der Einspeisung an Z₁L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z₄L

Sobald eine Prüfung nicht mit "Ja" angekreuzt wurde, muss der Messaufbau nochmals geprüft werden.

Ort, Datum

Unterschrift Elektrofachfirma

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber
